

MD - Ministerio del Deporte
Coordinación General de Administración de Instalaciones Deportivas
Dirección de Infraestructura Deportiva

PROYECTO: K002 MD- Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura 040

Líder del Proyecto:	Nieto Salas, Cristian Mauricio (cnieto@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Oyervide Pelet, Isabel Roselyne	Programas Relacionados:	CENTRO DE FORMACION DE DEPORTE COLECTIVO EN EL SECTOR DE CARPUELA EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, Provincia - Imbabura
Titular:	Noboa Fernandez, Carolina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	914800006515071	TIR:	56.10 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	2,612,599.33
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,468,455.67
Localidad de Gestión:	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2008 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	28/10/2015	Fecha de Fin Base:	31/07/2013
Modificado por:	Nieto Salas, Cristian Mauricio	Fecha del siguiente Hito:	13/11/2015

DATOS GENERALES

Descripción

OBJETIVO GENERAL: Finalizar de manera integral el Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura, incluyendo la ejecución o mejoramiento de obras que permitan tener una infraestructura sistémica para la formación, desarrollo y preparación de los deportistas y la juventud del sector; con el fin de entregar a la población, de manera organizada, instalaciones de calidad y brindar un mayor acceso a la práctica de actividades deportivas.

ESTRATEGIA:

- Contratar un estudio completo del Plan Integral de Construcción para obtener la base sobre la cual se deberá ejecutar los trabajos de terminación del Centro de Deportes colectivos.
- Entrega de proyecto integral complementario y transferencia de recursos al Instituto de Contratación de Obras para la ejecución de los trabajos.
- Mantener un permanente control del avance de las obras y brindar todo el apoyo y asesoramiento requerido.
- Exigir a Contratante y Contratista, el cumplimiento estricto del control de calidad, seguridad industrial, leyes, reglamentos y normas pertinentes.

Beneficios Cualitativos

- Mejorar la autoestima de la población infanto-juvenil.
- Construir un espacio recreativo que permita la masificación del deporte.
- Capacitar de manera integral a los jóvenes para impulsar la práctica competitiva del deporte.

Tipo de Beneficiario

187.706,00 personas (Deportistas, personas que realizan actividad física y población que acude como espectadora a los escenarios deportivos).


Restricciones

TIEMPO: 6 años
 COSTO: USD 17.070.306,49 a ser financiados con recursos del Presupuesto Institucional del Ministerio del Deporte, en el período 2008-2014.
 ALCANCE: Construcción de un Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura, con beneficiarios directos: 41.360 usuarios e indirectos: 300.000,00 personas

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.95 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2008 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

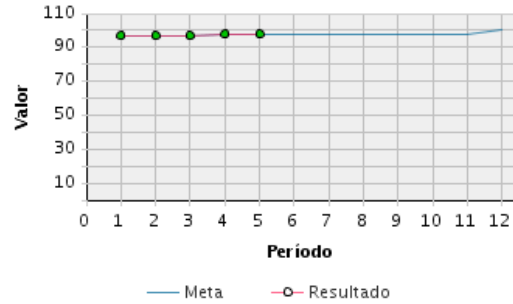

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	97 %	97 %	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	97 %	97 %	97 %	98 %	98 %							
Estado												
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2015:	Nieto Salas, Cristian Mauricio	28/10/2015 - 10:04 AM
ENERO 2015: 1.-Aprobación del POA por medio del Memorando Nro. MD-CGP-2015-0028, del 22 de enero de 2015. 2.- Mediante Memorando No. MD-DGID-2015-0071 del 27 de enero de 2015 se solicita cambio de fecha en los Hitos GPR. 3.- Mediante Memorando Nro. MD-CGAID-2015-0005 de fecha 29 de enero de 2015 se solicitó que se realicen las gestiones necesarias para la transferencia de recurso MD-SECOB por el monto \$ 1.009.945,46.	Nieto Salas, Cristian Mauricio	28/10/2015 - 10:03 AM
FEBRERO-ABRIL 2015 1.-Mediante Oficio No. SECOB-DG-2015-0374-O de fecha 04 de marzo de 2015 SECOB realiza la entrega de documentación de la Primera Fase de la Consultoría "EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA" 2.-Mediante Oficio No. MD-MD-2015-1955 de fecha 06 de marzo de 2015 se solicitó a SECOB el Estado Actual de la Consultoría "EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA" 3.-Mediante Oficio No. MD-MD-2015-2459 de fecha 23 de marzo de 2015 se solicitó a SECOB las fechas de entrega de las próximas fases de la consultoría que se encuentra en ejecución. 4.- Mediante Oficio No. SECOB-STE-2015-0082-O de fecha 06 de abril de 2015 SECOB informa que el día 08 de abril de 2015 se realizara la socialización de la Segunda Fase de la consultoría "EJECUCIÓN DEL ANALISIS DE RIESGO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO (CEAR) CARPUELA" 5.- Mediante Oficio No. SECOB-STE-2015-0085-O de fecha 08 de abril de 2015 SECOB realiza la Entrega de la información correspondiente a la Fase II de la consultoría que se encuentra en proceso de ejecución, solicitando informe técnico con recomendaciones y observaciones respecto a los productos entregados. 6.- Mediante Oficio No MD-DGID-2015-0019-OF de fecha 15 de abril de 2015 se remite a SECOB el informe técnico en el cual se incluye conclusiones y recomendaciones correspondientes a los productos de la FASE II de la consultoría en ejecución.		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
7.- Mediante Oficio No. MD-CGAID-2015-0050-OF de fecha 30 de abril de 2015 se solicita a SECOB información sobre expropiaciones que se hayan realizado para la construcción de la vía de Acceso al CEAR Carpuela.		
DICIEMBRE 2014: 1.- Acta de Entrega - Recepción Definitiva no se podrá cumplir hasta el 31 de Diciembre de 2014 2.- El consultor designado para el " Estudio de Consultoría de Riesgo Estructural", N° CD-0022-SECOB-2014 firmado el 19 de noviembre de 2014, se está esperando la entrega de la Primera Fase 3.- El avance físico de la obra corresponde al 100%.	Nieto Salas, Cristian Mauricio	30/01/2015 - 10:10 AM
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014: 1. En la visita realizada por el Supervisor de la zona, informa que siguen las mismas observaciones en el Centro de Alto rendimiento y que el contratista no ha realizado los trabajos que están pendientes por corregir en los diferentes escenarios deportivos que fueron materia del contrato suscrito entre el SECOB y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por esta razón no es procedente con la entrega-recepción definitiva de la obra.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	16/12/2014 - 09:40 AM
AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014: 1. En la visita realizada por el Supervisor de la zona, informa que siguen las mismas observaciones en el Centro de Alto rendimiento y que el contratista no ha realizado los trabajos que están pendientes por corregir en los diferentes escenarios deportivos que fueron materia del contrato suscrito entre el SECOB y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por esta razón no es procedente con la entrega-recepción definitiva de la obra.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	15/12/2014 - 05:08 PM
JUNIO Y JULIO 2014: 1.- El informe técnico y fotográfico de inspección CEAR Carpuela, abarca las visitas realizadas en los meses de Junio y Julio del presente año, debido a que el avance de la obra es mínimo. 2.- En la cancha de césped sintético se debe realizar una nivelación de ciertos sectores de la cancha, el retiro de la arena colocada y en su remplazo arena silícica especificada, para posteriormente proceder al peinado del material sintético. 3.- Por el sinúmero de observaciones existentes en todas las áreas del complejo deportivo no es recomendable proceder con la entrega recepción definitiva de la obra en forma total, ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército mientras dichos trabajos no se encuentren concluidos en su totalidad y se entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte .	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	19/08/2014 - 05:43 PM
ABRIL Y MAYO 2014: 1.-Recepción definitiva no se ha cumplido hasta la fecha, debido a que no se han realizado las correcciones respectivas.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	19/08/2014 - 05:36 PM
MARZO 2014: 2.-Recepción definitiva no se ha cumplido y es muy probable que al 31 de Marzode 2014 tampoco se tenga el mencionado documento. Debido a que en algunas edificaciones existen diferentes cuarteamientos en paredes, piso, cerámica, producido por asentamientos. El SECOB indica que el Ministerio del Deporte debe comunicar al contratista que realizo dichos trabajos de estructuras para la reparación de las misma, ya que está afectando los acabados realizados, por esta razón no se firma el acta de recepción definitiva.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	19/08/2014 - 05:36 PM
FEBRERO 2014: 1.- El 06 y 07 de febrero de 2014 viajaron al Complejo Deportivo de Carpuela funcionarios del SECOB, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y del Ministerio del Deporte para verificar los problemas que se han presentado luego de la recepción provisional de la obra. Las canchas de exteriores de uso múltiple se pudo constatar el crecimiento de las juntas de dilatación construidas entre los paños de las canchas, el asentamiento afecta incluso al graderío, se muestra cuarteado. 2.- El coliseo de uso múltiple desde el exterior se puede observar que el material de recubrimiento de la ventana posterior superior del coliseo, se encuentran desprendidas y no han sido reparadas. Las puertas metálicas de los camerinos ubicados en los costados del coliseo y bajo la tribuna, no se abren con facilidad ya que las puertas topan contra el suelo por estar descuadradas, dificultando su apertura, existen problemas en las instalaciones eléctricas no se prenden las lámparas, faltan colocar piezas eléctricas, existe humedad en el cielo raso bajo los baños de la planta alta. 3.- Por el sinnúmero de observaciones existentes en todas las áreas del Complejo Deportivo, no es recomendable proceder con la entrega recepción definitiva de la obra en forma total, ejecutada por el cuerpo de Ingenieros del Ejército, mientras dichos trabajos no se encuentren concluidos en su totalidad y se entregue a entera satisfacción del SECOB y del Ministerio del Deporte.	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	13/03/2014 - 11:28 AM
ENERO 2014: 1.- Mediante Memorando Nro. MD-CGP-2014-0033, de fecha 22 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación solicita a la Coordinadora General de Instalaciones	Fuertes Lopez, Edwin Alberto	04/02/2014 - 10:27 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Deportivas efectúe una reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014 de los proyectos de inversión que ejecuta esta Cartera de Estado, debido a una reforma presupuestaria de disminución de recursos económicos a los proyectos por un valor de \$ 22.886.283,56; del cual, \$ 1.402.777,37 corresponden al Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura".</p> <p>2.- Con Memorando Nro. MD-CGP-2014-0044, de fecha 29 de enero de 2014, la Coordinadora General de Planificación en atención al Memorando Nro. MD-CGAID-2014-0027 aprueba la reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura".</p>		
<p>1 AL 31 DE AGOSTO.</p> <p>Esta pendiente la firma de recepción definitiva del proyecto, responsabilidad del SECOB para que pueda entregar la obra al Ministerio del deporte, se ha insistido para que se proceda con este compromiso sin tener una respuesta favorable al requerimiento, preocupa porque los deportistas de la Provincia de Imbabura y del país ya están haciendo usos de las instalaciones, se han presentado observaciones constructivas a corregirse por parte de esta gerencia, ha pasado más de un año sin recibir respuesta, los planos as bit no entrega el SECOB al Ministerio del Deporte, de igual manera no se entrega oficialmente los equipos existentes y hasta la fecha no se realiza las capacitaciones ni entrega de manuales para la operación y mantenimientos de la planta paquete de agua potable, de los sistemas de bombeo, de las redes eléctricas y de sistemas de voz y datos.</p> <p>Se ha solicitado que el SECOB intervenga en generar estudios de suelo para determinar la falla geológica presentada en la zona de bloques educativos, donde se ha producido asentamientos afectando la estructura y paredes del bloque de aulas ubicado al pie del cerramiento principal y generar soluciones dependiendo de lo que arroje la consultoría.</p> <p>De igual manera se requiere intervención en el coliseo de usos múltiples que también presenta asentamientos geológicos en un extremo de la estructura, aquí la situación es más crítica porque se puede asentar la cubierta si no se detiene el desplazamiento existente, el SECOB tiene conocimiento de todas estas observaciones.</p> <p>Se espera el pronunciamiento del Administrador del contrato SECOB para viabilizar todos estos inconvenientes</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>05/09/2013 - 05:41 PM</p>
<p>1 AL 30 JUNIO</p> <p>El Ministerio del Deporte ha estado insistiendo que se cumplan los procesos pendientes a ejecutarse en el Centro de Entrenamiento de Carpuela para proceder con la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se espera por parte del ICO como Administrador del Contrato, la comunicación de que se han cumplido con las correcciones de las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, como también de que se entregue oficialmente los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en proceso constructivo del proyecto para su revisión.</p> <p>Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable.</p> <p>Esta Gerencia está a la espera del comunicado de que se han cumplido todos estos procesos pendientes y que se nos indique la fecha para recibir los trabajos a satisfacción por parte del ICO a este Ministerio.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>02/07/2013 - 09:25 AM</p>
<p>1 AL 31 MAYO 2013:</p> <p>A la fecha está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no existe por parte del ICO como Administrador del Contrato, la comunicación de que se han cumplido con las correcciones de las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, como también de que se entregue oficialmente los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en proceso constructivo del proyecto.</p> <p>Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable, se tenía previsto realizar esta entrega el 16 de Abril del presente año, pero por no encontrarse llena la cisterna de la planta no se pudo entregar los equipos y sistemas de bombeo de la planta procesadora de agua potable.</p> <p>Esta Gerencia está a la espera del comunicado de que se han cumplido todos estos procesos pendientes y que se nos indique la fecha para recibir los trabajos a satisfacción por parte del ICO a este Ministerio.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>24/06/2013 - 12:05 PM</p>
<p>1 AL 30 ABRIL</p> <p>Sigue pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>30/04/2013 - 01:02 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en proceso constructivo del proyecto.</p> <p>Está pendiente la entrega formal de funcionamiento de los equipo de captación y bombeo de agua desde el canal a la planta paquete de tratamiento de agua potable, se tenía previsto realizar esta entrega el 16 de Abril del presente, pero por no encontrarse llena la cisterna de la planta no se pudo entregar los equipos y sistemas de bombeo de la planta procesadora de agua potable.</p> <p>Se han capacitado a técnicos del Ministerio del Deporte la operación y mantenimiento de los tableros de control de los transformadores y equipos eléctricos del CEAR, como también de las cámaras de control y seguridad instaladas en el complejo.</p> <p>Se espera que el contratista cumpla con todos estos compromisos y observaciones pendientes que corregir, para que el ICO oficialice la fecha para proceder con la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra.</p>		
<p>15 AL 31 MARZO</p> <p>Está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en el proyecto.</p> <p>Con fecha 21 de Marzo del 2013 me traslado al CEAR de Carpuela para atender pedido del ICO con el acompañamiento para recibir por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército las diferentes unidades de sistemas en equipos y bombas instalados en áreas específicas para el funcionamiento del Centro de entrenamiento, competencia en su primera fase de recepción del Instituto de Contratación de Obras.</p> <p>Comunico la preocupación urgente de solucionar la falla estructural por asentamiento que está ocurriendo en el bloque educativo fachada posterior central del edificio, se detecta cuarteamientos de considerable magnitud en las paredes y columnas del bloque, como también existe desplazamiento en el cerramiento perimetral a la misma altura de la falla en el edificio, de las primeras conclusiones se observa que puede ser por la filtración de agua del canal de riego que pasa a tres metros del cerramiento y que se está filtrando subterráneamente por la mala compactación del suelo hasta el edificio.</p> <p>Se requiere ordenar oficialmente la intervención inmediata al ICO para solucionar inconvenientes mayores, verbalmente solicite se intervenga, pero esperan que se lo haga por escrito.</p> <p>Luego de esta inspección, nos reunimos con el Administrador del contrato del ICO Arq. Blas León, quien verbalmente nos solicita que recibamos los equipos y bombas al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a la cuál conjuntamente con los delegados técnicos del Ministerio del Deporte nos oponemos al pedido indicándole que no es el procedimiento técnico, ya que el proceso es de que el ICO con sus respectivos técnicos especialistas reciban al Cuerpo de Ingenieros del Ejército los equipos correspondientes bajo su entera responsabilidad, con sus respectivos diagramas, planos, manuales de funcionamiento y operación, luego emitir un informe de recibido a satisfacción bajo su responsabilidad y procedan a entregarnos al Ministerio del Deporte con el complemento de generar un cronograma con fechas y días para la capacitación por parte del Cuerpo de Ingenieros al personal del Ministerio que se va a encargar de las operaciones y mantenimiento de los equipos y sistemas.</p> <p>Lamentablemente nunca se dio la presencia de los responsables de las instalaciones de equipos y sistemas contratados, ni tampoco estuvieron técnicos especialistas eléctricos e hidrosanitarios del Instituto de Contratación de Obras responsables de recibir lo solicitado, mal coordinada esta visita por no contar con las personas y técnicos responsables de entregar los sistemas, como también de los técnicos del ICO responsables de recibir los equipos.</p> <p>Se espera que el ICO oficialice por escrito una nueva fecha con las indicaciones entregadas para generar un proceso técnico adecuado y con la presencia de técnicos del ICO que certifiquen de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas la funcionalidad de los equipos y sistemas a recibir el Ministerio del Deporte.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>31/03/2013 - 09:57 AM</p>
<p>28 DE FEBRERO 2013</p> <p>Se encuentra pendiente la comunicación oficial por parte del Instituto de Contratación de Obras ICO, de las observaciones a corregirse por parte del contratista "Cuerpo de Ingenieros del Ejército", remitidos por la Gerencia del Ministerio del Deporte con fecha 13 de Diciembre</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>27/02/2013 - 08:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>del 2012, se recalca al equipo de fiscalización del ICO y al Administrador del Contrato que es su responsabilidad el verificar y constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas contratadas solicitándose que se ordene al Contratista CEE proceder con las correcciones de las diferentes observaciones arquitectónicas y de Ingenierías que se presentan en todos los edificios del proyecto.</p> <p>Está pendiente la firma del Acta de Recepción Definitiva de la obra hasta que el ICO como Administrador del Contrato, oficialice bajo su responsabilidad de que el contratista encargado de la ejecución de la obra ha cumplido con las observaciones presentadas por la Gerencia del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, como también de que se entregue oficialmente al Ministerio del Deporte los planos as bit de los rediseños de los sistemas de las diferentes ingenierías aplicadas en el proyecto.</p> <p>Hasta la presente fecha no se ha cumplido con todos los requerimientos planteados ni con los compromisos asumidos en las reuniones de SNAP por parte de las responsables de la entrega de la obra al Ministerio del Deporte</p>		
<p>AL 31 DE DICIEMBRE 2012: Al 20 de Julio de 2012, esta Gerencia generó cerca de 120 observaciones a corregir, las mismas que se ratifican para su cumplimiento el 18 de Octubre de 2012, fecha en que se firma el Acta de Recepción Provisional, donde se anexa nuevamente el requerimiento de cumplir con las observaciones constructivas, todos esos requerimientos deben cumplirse hasta la fecha de firma del Acta de Recepción Definitiva, que son 90 días después de la firma del Acta Provisional.</p> <p>Hasta la fecha se han presentado imprevistos constructivos de las obras anteriores al proyecto contractual, tales como fallas constructivas de asentamiento estructural de la pared posterior del coliseo de usos múltiples, donde se tuvo que diseñar una propuesta estructural para corregir en el menor tiempo posible los problemas de asentamientos que afectaban a las columnas y vigas inferiores y superiores de la pared posterior del coliseo, las mismas que se visualizaban en el piso y paredes del edificio, sino se tomaba la decisión de intervenir, se hubiese generado el asentamiento de la cubierta estructural por el desplazamiento de las columnas del lado noreste, proceso que demoró aproximadamente 3 meses en ser resuelto.</p> <p>Otro de los inconvenientes fue el proceso de instalación del material sintético en la pista atlética, el mismo que acarrea procesos constructivos mal concebidos desde años atrás, y además con la terminación unilateral por incumplimiento de implementación de la pista por parte de la Federación Deportiva del Carchi. En este período se tuvo que solicitar al ICO, la intervención de las correcciones técnicas de la pista, como el levantamiento de la capa asfáltica instalada, que presentaba un deterioro por el trajinar de maquinaria pesada sobre el anillo de la pista por los trabajos de reacondicionamiento del Centro de Entrenamiento, por lo que, el Ministerio del Deporte asume la responsabilidad inmediata de contratar una nueva pista de material sintético, y ordenar al Instituto de Contratación de Obras, que asuma la corrección de la pista atlética y la cancha de césped natural que estaba mal construida, ya que no se encontraba al nivel de la pista atlética que es lo que reglamentariamente se recomienda.</p> <p>El ICO concluyó los trabajos de nivelación de la pista con el nuevo material asfáltico, el técnico contratado por el Ministerio del Deporte, procederá a la colocación del material sintético, previo a que el material asfáltico cumpla con el proceso de secado de los materiales aceitosos que arroja, este proceso se desarrollará en los primeros días del mes de Enero de 2013.</p> <p>Todos estos imprevistos generan que los tiempos para la terminación y entrega del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, vayan generando prórrogas y aplazamientos en la fecha de terminación. Los procesos y observaciones de correcciones se están cumpliendo paralelamente con la implementación del equipamiento del Centro.</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>11/01/2013 - 06:51 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE - OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012: Se generan observaciones específicas en las áreas del Coliseo de usos múltiples y Pista atlética, donde se generan inconvenientes urgentes a resolver.</p> <p>COLISEO DE USOS MULTIPLES.- El Ministerio del Deporte solicita al ICO en el mes de Agosto, la intervención inmediata para corregir deficiencias estructurales en la cimentación y columnas del lado este, donde se produce asentamientos que originan el cuarteamiento de las vigas de amarre superiores e inferiores, provocando el desplazamiento de la plataforma de la cancha y de las paredes por el asentamiento de las bases de las columnas del ala este.</p> <p>En el mes de Octubre se generan trabajos de reforzamiento del terreno del lado norte del coliseo con la construcción de un muro de hormigón armado en todo el largo lateral del mismo, con esto se estabiliza el desplazamiento que existía del terreno, y se realizaron ensayos de laboratorio para verificar el tipo de suelo existente en el sector, confirmandose un suelo de relleno inestable y sin la compactación adecuada, no se realizó mejoramiento de suelo simplemente se relleno con material del sitio proveniente de las laderas del cerro. En el mes de Noviembre se trabaja en el reforzamiento de los cimientos (plintos) los mismos que no tenían el calculo adecuado para generar el soporte de las cargas que iban a recibir, estos no cumplían técnicamente el espesor y diámetros necesarios para su absorber los esfuerzos a producirse, se refuerzan los dados a un</p>	<p>Córdova Peñañiel, Italo Alejandro</p>	<p>11/12/2012 - 11:28 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>diámetro de 1.50x1.50 con una altura de 1.50, para estabilizar y absorber las cargas producidas por la estructura de la cubierta, En el mes de Diciembre se trabaja en el reforzamiento de las vigas inferiores y superiores con la colocación de placas de acero de refuerzo sujetando la viga en el área de corte producida por las cargas y desplazamientos, se colocan en la parte posterior de la pared unos anclajes de acero para sostener y estabilizar la pared posterior del coliseo, la misma que por su altura y los fuertes vientos que corren en la zona vibra produciendo afectación a la estructura de la cubierta.</p> <p>PISTA ATLÉTICA.- Con la visita del Sr. Ministro en el mes de Septiembre, se solicita intervenir en la corrección y nivelación de la cancha de césped de la pista atlética y la colocación de la pista sintética reglamentaria en el anillo existente de la pista. En el mes de Octubre se comienzan los trabajos de reconformación y nivelación de la cancha de césped la misma que se encontraba a 0.45cm más alto que el nivel de la pista atlética, siendo esto antirreglamentario para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas del atletismo, para el mes de Noviembre se trabaja en el levantamiento del asfalto de la pista por su deterioro y desniveles, en los primeros días del mes de Diciembre se comienza a nivelar y compactar la base de la pista de acuerdo a las recomendaciones técnicas presentadas por el Ministerio del Deporte a través del contratista encargado de la instalación de la pista sintética, este es el proceso más importante para que la pista cumpla con los requerimientos técnicos, se tienen que verificar por tramos de 3 a 5 metros los niveles de la base que se compacta no puede ser mayor a 1% la pendiente de la pista hacia la cuneta perimetral, luego de la nivelación el siguiente paso es la colocación del asfalto verificar de igual manera sus niveles y proceder luego a que se seque todas las impurezas aceitosas que arroja este material para que no produzca el rechazo de adherencia del material sintético al asfalto, antes de su colocación se debe limpiar o lavar el asfalto para proceder a la instalación del material sintético de la pista, a la fecha se trabaja en el impregnado de la pista previo a la colocación del asfalto.</p>		
<p>AL 30 AGOSTO.- Se entregan observaciones al ICO correspondiente a deficiencias constructivas presentadas en la obra física, estos detalles se deberán ejecutar antes de generar el Acta de Recepción Provisional, estas observaciones son generadas por esta Gerencia para que por intermedio del ICO se las hagan llegar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y se cumplan para contar con una mejor funcionalidad del proyecto, además se entregan observaciones tecnológicas y eléctricas para ser consideradas para su respectiva corrección, es obligación del ICO hacer cumplir al CEE. estas correcciones para que el Ministerio del Deporte pueda recibir a satisfacción la obra.</p>	Córdova Peñafiel, Italo Alejandro	10/12/2012 - 03:44 PM
<p>NOVIEMBRE 2012: El Ministerio del Deporte se encuentra en espera de la Recepción definitiva de la obra, a generarse ente el ICO y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Contratista). A la fecha el Ministerio del Deporte asume la responsabilidad de la administración y seguridad del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento; es responsabilidad del CEE según la Ley de Contratación de corregir cualquier falla constructiva, hasta la fecha que se genere el Acta de Recepción Definitiva.</p>	Córdova Peñafiel, Italo Alejandro	14/11/2012 - 11:10 AM
<p>OCTUBRE 2012: Se ha procedido por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito contratista de la obra a ejecutar y cumplir las observaciones para corregir detalles constructivos arquitectónicos, de voz y datos y eléctricos, presentados por la Gerencia del Ministerio del Deporte, para proceder a generar la recepción provisional del proyecto. El ICO Administrador del contrato deberá entregar previo a la firma del Acta de Recepción Provisional los planos rediseñados de las obras de ingeniería como son Hidrosanitarias, eléctricas y tecnológicas; la recepción provisional está prevista para su firma para el día 05 de Septiembre del 2012.</p> <p>Con fecha 18 de octubre de 2012, los miembros de la Comisión de Recepción Provisional se ratifican en el contenido del Acta y para constancia de ella la suscriben en cuatro ejemplares del mismo tenor y valor. En la localidad de Carpuela, Parroquia de Ambuquí, Cantón Ibarra de la Provincia de Imbabura, se firma el Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra.</p>	Córdova Peñafiel, Italo Alejandro	23/10/2012 - 09:54 AM
<p>SEPTIEMBRE 2012: La Subsecretaría Técnica de Apoyo elaboró el informe con los justificativos del cambio de nombre del Proyecto de "Centro de Alto Rendimiento" a "Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento". La Consultoría para el Modelo de Gestión e Implementación para los Centros Deportivos de Rioverde y Carpuela, basó la ejecución de sus productos en el concepto de Centros para el Alto Rendimiento, pero como se señaló anteriormente, los espacios deportivos de los centros originalmente estuvieron diseñados para el deporte formativo. Durante la segunda etapa de construcción y finalización de las obras por la actual administración del Ministerio del Deporte, se concluyó que si bien la mayoría de espacios deportivos podían ser modificados para cumplir las normativas oficiales que el deporte de alto rendimiento requiere, otros no podían serlo. Es así que considerando la alta calidad de los servicios deportivos que pueden proveer los centros, y al mismo tiempo la visión del modelo de gestión, se ha definido que los centros se denominen "Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento" acogiendo la condición de híbrido entre instalaciones para la formación - desarrollo deportivo y deporte para el Alto Rendimiento.</p>		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2012: La obra física se terminó el 30 de junio de 2012, no se ha procedido a la firma del acta de recepción provisional porque hasta la presente fecha se realizan las pruebas de funcionalidad de toda la infraestructura hidrosanitarias, tecnológica y de climatización del complejo; además de correcciones constructivas que se han presentado durante la ejecución del proyecto, para mejorar en la presentación y acabado de la obra.</p> <p>JUNIO 2012: Se realizan las pruebas de funcionamiento de la planta de tratamiento, se solicita por parte del contratista, instalar una bomba de presión de 7 HP para dar mayor presión al caudal que sale del tanque de reserva. Está pendiente la firma de convenio con EMELNORTE. para la conexión del transformador de 300KWA instalado por el CEE. además solicitan implementar elementos de seguridad a los dos transformadores existentes, en espera de la firma del convenio para realizar estos trabajos. Avance del proyecto 98%</p> <p>MAYO 2012: Se ejecuta el proceso constructivo del tanque de reserva para tratamiento de agua potable, esta listo para el proceso de pruebas de llenado y filtración. Se generan trabajos de modificación del área de cocina, implementación del equipamiento necesario para su correcto funcionamiento. A través de EMELNORTE se procede a la implementación de energía eléctrica para la dotación del Complejo, y proceder a la conducción de la red trifásica para las pruebas de funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable.</p>		

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Retraso en la firma del acta de recepción definitiva	28/10/2015	Cristian Mauricio Nieto Salas	100	90	90	2/3

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Internacional - Exterior > America Latina y el Caribe > Embajada / Consulado
2	Zona 1 - Norte > Imbabura > Pimampiro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCIÓN: Acta entrega - recepción de los productos de la consultoría PIC - Carpuela entregada	9-Entregables Formales	08/02/2011		25/03/2011		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN: Firma de actas de recepción y de mutuo acuerdo de contratos de arrastre realizada	5-Entregables Intermedios	22/07/2011		30/07/2011		Sí	2.0
3	EJECUCIÓN: Proyecto Integral Complementario al ICO entregado	5-Entregables Intermedios	16/08/2011		16/08/2011		Sí	2.0
4	EJECUCIÓN: Modificación Presupuestaria por reasignación de recursos a ICO realizada	5-Entregables Intermedios	31/08/2011		29/08/2011		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	EJECUCIÓN: Resolución de terminación unilateral de contratos de arrastre realizada	5-Entregables Intermedios	31/08/2011		31/08/2011		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Traspaso de fondos al ICO ejecutado	5-Entregables Intermedios	09/09/2011		07/09/2011		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	28/10/2011		28/10/2011		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	28/11/2011		28/11/2011		Sí	3.0
9	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	28/12/2011		28/12/2011		Sí	3.0
10	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	28/01/2012		28/01/2012		Sí	3.0
11	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	16/03/2012		16/03/2012		Sí	3.0
12	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	29/03/2012		29/03/2012		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	12/04/2012		12/04/2012		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	17/05/2012		17/05/2012		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	31/05/2012		31/05/2012		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	15/06/2012		15/06/2012		Sí	3.0
17	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	29/06/2012		29/06/2012		Sí	4.0
18	CIERRE: Acta de entrega provisional de obra por parte del ICO entregada	9-Entregables Formales	30/06/2012		18/10/2012		Sí	3.0
19	EJECUCIÓN: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	30/06/2012		30/06/2012		Sí	5.0
20	CIERRE: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	15/07/2012		15/07/2012		Sí	3.0
21	CIERRE: Informe de Gestión Gerente entregado	5-Entregables Intermedios	31/07/2012		31/07/2012		Sí	2.0
22	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de diciembre 2012	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	2.0
23	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de enero 2013	9-Entregables Formales	31/01/2013		31/01/2013		Sí	1.0
24	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 28 de febrero 2013	9-Entregables Formales	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
25	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de marzo 2013	9-Entregables Formales	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
26	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 30 de Abril 2013	9-Entregables Formales	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
27	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento	9-Entregables Formales	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de la obra entregado al 31 de mayo 2013							
28	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 30 de junio 2013	9-Entregables Formales	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
29	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de julio 2013	9-Entregables Formales	31/07/2013		31/07/2013		Sí	3.0
30	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 30 de agosto 2013	9-Entregables Formales	30/08/2013		30/08/2013		Sí	3.0
31	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 30 de septiembre 2013	9-Entregables Formales	30/09/2013		30/09/2013		Sí	3.0
32	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de octubre 2013	9-Entregables Formales	31/10/2013		31/10/2013		Sí	3.0
33	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 29 de noviembre 2013	9-Entregables Formales	29/11/2013		29/11/2013		Sí	2.0
34	CIERRE: Solicitud de reforma y reprogramación de fondos al Plan Operativo Anual 2014, por disminución de recursos económicos cuentas de obras por liquidar realizada	5-Entregables Intermedios	22/01/2014		22/01/2014		Sí	1.0
35	CIERRE: Reforma y reprogramación al Plan Operativo Anual 2014 del Proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela provincia de Imbabura" cuentas de obras por liquidar aprobada	5-Entregables Intermedios	29/01/2014		29/01/2014		Sí	1.0
36	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		20/02/2014		Sí	1.0
37	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Marzo 2014	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
38	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Abril 2014	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	1.0
39	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Mayo 2014	5-Entregables Intermedios	30/05/2014		30/05/2014		Sí	1.0
40	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Junio 2014	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.0
41	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Julio 2014	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.0
42	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Agosto 2014	5-Entregables Intermedios	29/08/2014		29/08/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Septiembre 2014	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.0
44	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Octubre 2014	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	1.0
45	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra de la obra Noviembre 2014	5-Entregables Intermedios	28/11/2014		28/11/2014		Sí	1.0
46	CIERRE: POA proyecto 2015 aprobado	9-Entregables Formales	30/01/2015		30/01/2015		Sí	0.0
47	CIERRE: Liquidación Cuentas de arrastre - SECOB realizado	9-Entregables Formales	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.0
48	CIERRE: Informe de seguimiento al funcionamiento de la obra entregado al 31 de marzo 2015	9-Entregables Formales	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.0
49	CIERRE: Informe de Revisión Fase 2 de los Productos de Consultoría Externa del análisis de riesgo CEAR Carpuela	9-Entregables Formales	01/04/2015		01/04/2015		Sí	0.5
50	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra mes de Abril 2015	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.5
51	CIERRE: Informe Final de Revisión Fase 3 de los Productos de Consultoría Externa del análisis de riesgo CEAR Carpuela	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.0
52	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra mes de Julio 2015	5-Entregables Intermedios	31/07/2015	13/11/2015			No	0.0
53	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra mes de Agosto 2015	5-Entregables Intermedios	31/08/2015	13/11/2015			No	0.0
54	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra mes de Septiembre 2015	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	13/11/2015			No	0.0
55	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra mes de Octubre 2015	5-Entregables Intermedios	31/10/2015	13/11/2015			No	0.0
56	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra mes de Noviembre 2015	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	0.0
57	CIERRE: Acta de recepción definitiva de la obra por parte del ICO	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015	31/12/2015			No	2.0
58	CIERRE: Informe de actividades y seguimiento de la obra mes de Diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	31/12/2015	31/12/2015			No	0.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Historico - En la visita realizada el viernes 09-12-2011, al lugar donde se construye el "Centro de Formación de deportes	Rivadeneira Burbano, Gabriela Alejandra	{PR} - Provincia - IMBABURA	13/12/2011

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
	colectivos en el sector de Carpuela en la Provincia de Imbabura, se pudo o			
2	Historico - ESTA ABANDONADA LA OBRA	Davila Guevara, Pedro Jorge	{PR} - Provincia - IMBABURA	22/06/2011

ACCIONES CLAVE

	T	Acción Clave	Responsable	Remitente	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Prioridad
1		TOMAR CONTACTO CON MINISTERIO DEL DEPORTE PARA CONOCER EL MOTIVO DE SUSPENSION OBRA, EN VIRTUD DE QUE SE ESTA DETERIORANDO	Rivadeneira, Adrián	Davila Guevara, Pedro Jorge	22/06/2011	22/06/2011	Alta

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,468,455.67 **
Costo Total:	17,070,306.49
Total Devengado:	11,468,455.67
% Costo Total Devengado:	67.18 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 67.18 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,109,920.53	270,243.54	0.00	7,380,164.07
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	10,339,715.42	1,280,189.00	0.00	11,619,904.42
Ppto. Codificado	977,787.67	0.00	0.00	977,787.67
Ppto. Comprometido	691,600.00	0.00	0.00	691,600.00
Planeado - Codificado (2015)		270,243.54		
Programado a Devengar	11,468,455.67	0.00	0.00	11,468,455.67
Ppto. Devengado	11,468,455.67	0.00	0.00	11,468,455.67
Estimado a fin de año	* 11,468,455.67	270,243.54	0.00	11,738,699.21
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	-270,243.54	0.00	-270,243.54
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %
Ppto. Codificado 998	432,250.00	0.00	0.00	432,250.00
Ppto. Devengado 998	432,250.00	0.00	0.00	432,250.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

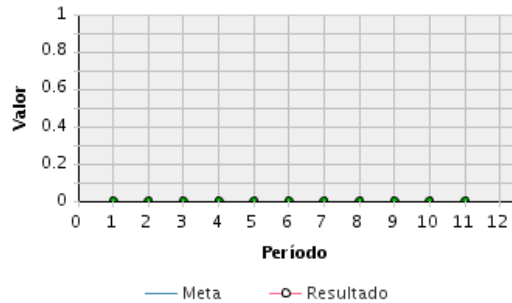

Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	100.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Oct	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Nov	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la eficacia de la Dirección de infraestructura Deportiva MEDIANTE la automatización del registro y operación de proyectos y la implementación de una Guía Integral para la ejecución de proyectos

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		Oficio_para_Mayor_Checa_ICO._21-12-11.docx	06/01/2012
2		Oficio_para_C_I_Ej._21-12-11.docx	06/01/2012
3	30 Abril solicitud inf. SECOB	B3.pdf	15/05/2015
4	A1 Cumplimiento HITO 35	A1_Cumplimiento_HITO_35.pdf	04/02/2014
5	A2 Cumplimiento HITO 36	A2_Cumplimiento_HITO_36.pdf	04/02/2014
6	Acta de entrega recepción provisional Centro de Formación y Desarrollo de Deportes Colectivos en Carpuela	Acta_de_entrega_recepción_provisional_Centro_de_Formación_y_De	03/10/2012
7	Circular para involucrados	CIRCULAR_NO_1_PARA_TODOS.docx	06/01/2012
8	Cumplimiento HITO 26	carpuela_30_Abril.jpg	15/05/2013
9	Cumplimiento HITO 27	oficio_74.pdf	03/06/2013
10	Cumplimiento HITO 28	carpuela_30_junio.pdf	02/07/2013
11	Cumplimiento HITO 37 - Informe de actividades y seguimiento de la obra Febrero 2014 realizado	A3.pdf	20/02/2014
12	INFORME al 31 enero/2012	INFORME_FINAL_CARPUELA.pdf	09/02/2012
13	Informe Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento "Carpuela y Rio verde"	Resumen_Ejecutivo-Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_Carpuela_y_Rio_verde.pdf	10/09/2012
14	Informe de Abril 2015	A9_INFORME_ABRIL.pdf	17/04/2015
15	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 12-04-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_12-04-2012.pdf	21/05/2012
16	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 15-06-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_15-06-2012.pdf	26/06/2012
17	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 15-07-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_15-07-2012.pdf	27/07/2012

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 16-03-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_16-03-2012.pdf	21/06/2012
19	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 17-05-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_17-05-2012.pdf	21/06/2012
20	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 29-03-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_29-03-2012.pdf	21/06/2012
21	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 30-06-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_30-06-2012.pdf	26/07/2012
22	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 31-05-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_31-05-2012.pdf	21/06/2012
23	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 31-07-2012	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_31-07-2012.pdf	20/09/2012
24	Informe de actividades y seguimiento Carpuela 31-12-2012	Informe_de_seguimiento_y_avances-Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_en_Carpuela_31-12-2012.pdf	28/01/2013
25	Informe de actividades y seguimiento Carpuela al 28 febrero 2013	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_al_28_febrero_2013.pdf	28/02/2013
26	Informe de actividades y seguimiento Carpuela al 31-03-2013	Informe_de_actividades_y_seguimiento_Carpuela_al_31_de_marzo_2013.pdf	01/04/2013
27	Informe de actividades y seguimiento Carpuela- Junio y Julio 2014	A4-Cumplimiento_HITOS_41_y_42.pdf	19/08/2014
28	Informe de Gestión Gerente Diciembre 2012 seguimiento Carpuela	Informe_de_seguimiento_y_avances-Centro_de_Entrenamiento_para_el_Alto_Rendimiento_en_Carpuela_31-12-2012.pdf	27/02/2013
29	Informe de Gestión Gerente Enero 2013 seguimiento Carpuela	Informe_de_Gestión_Gerente_seguimiento_Carpuela_al_31-enero-2013.pdf	27/02/2013
30	Informe de visita realizada septiembre 2014, cumplimiento hito 44	A6.pdf	24/10/2014
31	Informe Especial	INF.ESPECIAL_Formato_corregido.docx	06/01/2012
32	Informe Fase II Estudios Abril 2015	B1.pdf	17/04/2015
33	Informe Seguimiento mes de Marzo 2015	B2.pdf	17/04/2015
34	Memorando No MD--DGID-2015-0071	A7.pdf	05/02/2015
35	Memorando No MD-CGP-2015-0028	A8.pdf	05/02/2015
36	Oficio actualización del dictamen de prioridad del proyecto "Centro de formación de deporte colectivo en el sector de Carpuela en la provincia de Imbabura" 16-04-2014	A5_Oficio_actualización_del_dictamen_de_prioridad.pdf	29/08/2014
37	Oficio contestando comentario de Gobernadora Imbabura en EVALUACIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS.	Oficio_a_Gobernadora_Imbabura.pdf	09/02/2012
38	Oficio de respuesta a Gobernadora de Imbabura-Proyecto Centro de Alto Rendimiento en Carpuela	Oficio_respuesta_a_Gobernadora_de_Imbabura.pdf	15/06/2012
39	Oficio Entrega de la Revisión Fase II	B1.1.pdf	17/04/2015
40	Oficio Priorización SENPLADES-Proyectos de Inversión	Oficio_Priorización_SENPLADES-Proyectos_Inversión.pdf	04/03/2013
41	Problemas no resueltos Enero 2011 a Mayo 2012	Problemas_no_resueltos_Enero_2011_a_Mayo_2012.doc	04/10/2012
42	Reporte de transferencias al ICO 2012-Carpuela	Reporte_de_transferencias_al_ICO-Carpuela_Rio_verde_y_CAR_CUECA_2012.pdf	05/12/2012
43	Resumen Ejecutivo 2008-2011	Resumen_Ejecutivo_DICIEMBRE_2008-_2011.doc	26/01/2012
44	Resumen Ejecutivo ENERO-ABRIL 2012	Resumen_Ejecutivo_ENERO-ABRIL_2012.doc	17/07/2012

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Amaguaya Guananga, Ruth Lucía	Líder de proyecto	Analista de Infraestructura	ramaguaya@deporte.gob.ec	
Reyes Andrade, Jorge Ernesto	Monitor	Director de Infraestructura Deportiva	jreyes@deporte.gob.ec	
