


- **Algemeen**
- **Uitgangspunten**
- **Het conversieproces**
- **Conversietempo**
- **Hoe verder?**

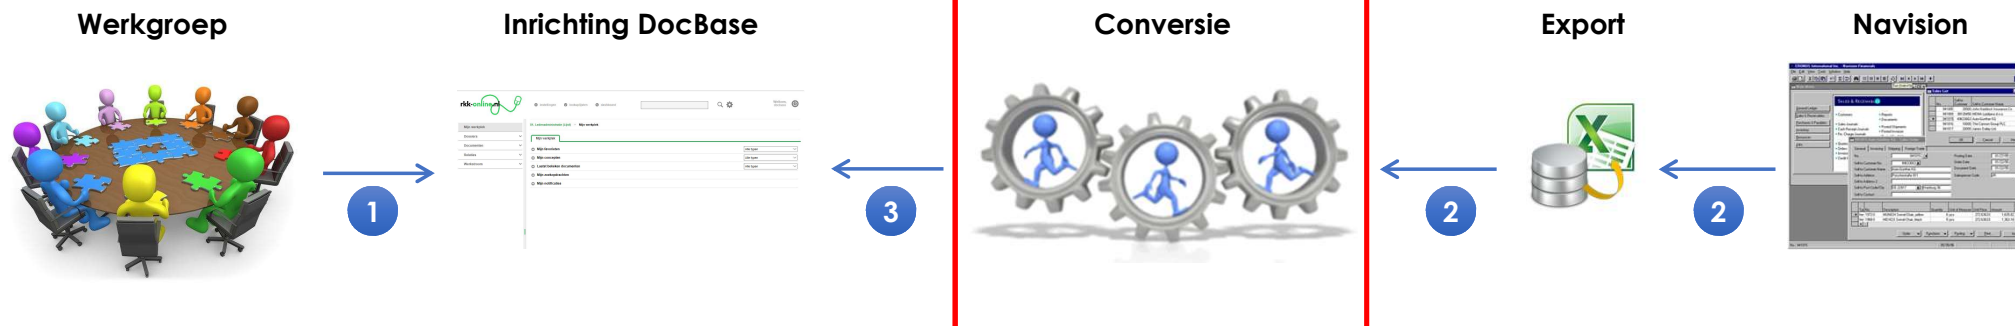

Uitgangspunten

- Ruim 700 te converteren databases
- Verschil in datagebruik
- Verschil in soort fusie


Opzet aanpak

- Conversiestappen opknippen om te leren van de eerste conversies
- Conversiescripts aanpassen o.b.v. bevindingen
- Bij uitblijven van nieuwe bevindingen, conversietempo verhogen

Conversie per parochie

Het conversieproces

Conversiestappen, waaronder;

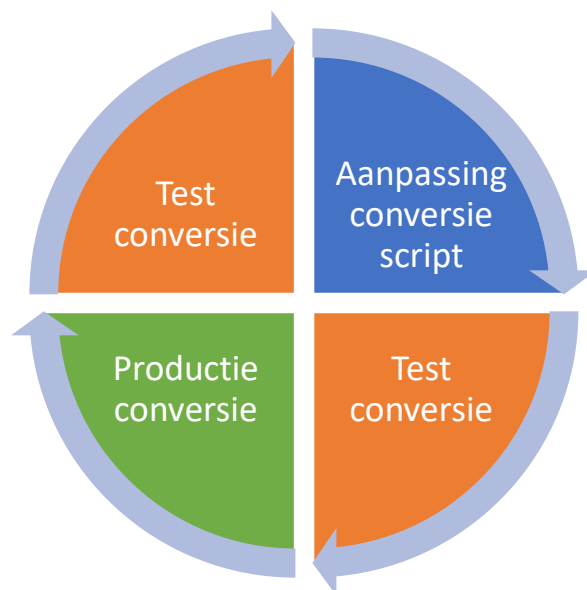

- **Leden inlezen** (*lokaal en parochiaan*)
- **Bestaande SILA relaties bijwerken**
- **Vrijwilligers inlezen en koppelen**
- **Getrouwden koppelen**
- **Kerkelijke data inlezen en koppelen**
- **Debiteuren en abonnementen inlezen en koppelen**
- **Debiteuren en abonnementen aanmaken in Exact**
-

Het conversieproces loopt stroef! waar gaat het mis?

1. **Datafouten**
2. **(Te)veel menselijke inspanningen per conversie**

Datafouten

- **Dubbele SILAnummers**
- **Foute en/of ontbrekende rekeningnummers**
- **Interpretatieverschillen qua gebruik specifieke kenmerken** (o.a. looplijsten en bezorgingen)
- **Ondanks centrale fusie, toch nog (nieuwe) registraties op oude kaski-nummer**
- **Conversiescript fouten** (o.a.):
 - **Ondanks decentrale fusie, toch alle vrijwilligers bij alle fusieparochies zichtbaar**
 - **Blokkade bij teveel en te snelle aanmaak van nieuwe debiteuren in Exact**
- **#**

(Te)veel menselijke inspanningen per conversie

- **Inspanningen en fouten door conversieteam (o.a.):**
 - **Export uit Navision** (soms onjuist)
 - **Dataconversie-instellingen op basis van fusiesoort** (soms onjuist ingegeven)
 - **Exact administratie klaar zetten** (soms o.b.v. onjuiste kaskinummer/administratienummer)
 - **Aanmaken (test)gebruikers in DocBase**
 - **Leegmaken/terugrollen testomgeving na test**
 - **Aanpassen conversiescripts o.b.v. bevindingen**
 - **Opnieuw Navision export inlezen in (test)omgeving** (gaat soms fout door gebruik oude conversiescripts)
 - **Terugrollen van de productieomgeving, incl. Exact,** (doordat er na het testen nog fouten worden ontdekt)
 - **Conversie op de productie-omgeving → leidt tot trage werking van DocBase**
 - **Veel support bieden aan de parochies tijdens conversiefase** (→ opzet FAQ ?)

(Te)veel menselijke inspanningen per conversie

- **Inspanningen en fouten door parochies (o.a.):**
 - **Testen soms onvolledig, waardoor fouten ook nog in productie worden gevonden**
 - **Testplanning vergt veel van de vrijwilligers en hervatting een dag later (na onjuiste conversie) kan vaak niet**
 - **Raadpleging van de filmpjes is soms nog onvoldoende** (waardoor er nog veel vragen open blijven)

Hoe **nu** verder?

- Het aantal uitzondering loopt terug
- Data import in Exact kan achteraf worden doorgevoerd
- Aanpassingen fusiesoorten worden doorgevoerd
- Nog enkele “enkelvoudige” parochie conversies

Hoe **binnenkort** verder?

- Export van alle parochies per bisdom
- Verwerking conversiedata van alle parochies per bisdom
- Geen testconversie fase meer
